

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

PSČ 738 01

Naše. sp. zn.: 114/24

V Ostravě dne 11. 6. 2025

Žádost o poskytnutí informací

ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dovoluji si vás požádat ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k poskytnutí fotokopii níže uvedených dokumentů týkajících se stavby splaškové kanalizace v obci Skalice u Frýdku-Místku, která se realizovala v roce 2024, a to:

- stavební deník ke stavbě,
- protokol o předání a převzetí stavby.

Důvodem žádosti je řešení náhrady škody způsobené projekční kanceláří klientovi, společnosti Markon reality, s.r.o., která ve stejné době realizovala splaškovou kanalizaci s napojením na kanalizaci budovanou obcí.

Za vyřízení mé žádosti velice děkuji.

V případě potřeby je možné mne kontaktovat též telefonicky



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor investiční
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:
Ze dne: 2025-06-11 00:00:00.000000
Číslo jednací: MMFM 137988/2025
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum: 25.06.2025

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 11.06.2025 a po e-mailové korespondenci, resp. Vašem upřesnění požadavku ze dne 17.06.2025 a 23.06.2025 Vám ke stavbě "Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice" zasíláme

- kopii vybraných listů stavebního deníku, týkající se realizace části zájmové stoky A2
- kopii výřezu ze situačního výkresu části zájmové stoky A2
- kopii "Protokolu o předání a převzetí díla".

S pozdravem

Ing. Kateřina Dehnerová
vedoucí investičního odboru
v době nepřítomnosti zastoupena Ing. Pavlem Rekem

Firma: METROSTAV a.s.

Divize (středisko, provoz): DIVIZE 1 - OSTRAVA

STAVEBNÍ DENÍK č. 2

Stavba: KANALIZACE FRYDEK-MÍSTEK - SKALICE

VEDEMNÍ SMYSLUJÍCÍ DENÍK
PŘÍLOHA:

Zaveden dne: 19. 11. 2020

Místo stavby:

Pro objekt: KANALIZACE FRYDEK-MÍSTEK - SKALICE

Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ

Úsek:

Okres: FRYDEK-MÍSTEK

Obec: STARÉ MĚSTO - SKALICE - KAMENEC

Místo: 738 01

Stavba je realizována podle:

Ohlášení ze dne:

Stavebního povolení na: KANALIZACE FRYDEK-MÍSTEK - SKALICE

„ Datum: 13.4.2011

č.j.: 0270 Z/00-10/2008/KL/231. Z

Stavebního povolení na:

Datum:

č.j.:

Stavebního povolení na:

Datum:

č.j.:

Veřejnoprávní smlouvy ze dne:

Oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení ze dne:

Vyplnit údaje k dokumentu, podle kterého je stavba realizována.

Účastníci výstavby:

Název obchodní firmy, sídlo podnikání

Odpovědní zástupci - jméno, adresa, telefon, podpisový vzor

Zhotovitele: METROSTAV a.s.

KOŽELUŽSKÁ 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ0014915, ID dat. schr. bu2cf46

kontaktní osoby

Stavebníka (objednatele): STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

RADNICKÁ 1143, FRÝDEK 738 01, FRÝDEK-MÍSTEK, IČ: 002 96643, DIČ: CZ00296643

ID DAT: WAK/bu 13

Projektanta: k osobním údajům připojit otisk razítka prokazujícího oprávnění k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační zákon)

Generální projektant: SWECO HYDROPROJEKT a.s. DIVIZE POZEMKA

Odpovědný projektant:

Podzhotovitelů:

Zapsat nebo uvádět odkaz na seznam podzhotovitelů, vedený dle ORĐ.

Denní záznamy stavby:

List č. 55228

Datum:

KONSTRUKČNÍ ÚSTUPNÍ VOPRAVY. ŽÁDÁNÍ
O PŘEŠTĚP TOUTO STAV, ABY MĚLY DO
BUDOVY ODHODNOUTI ÚSTUPNÍ VOPRAVY
ZA ÚHODNOUTE

POČASÍ: 2°C POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7-17h

19.3.21

PRACOVNÍCI: MTS-5, CINGEL-12

, SLOUHAL STAV-12

PÁ

STROJE: viz 19.3.21

PRÁCE: A, A2-Š 2/1-2/15, C1/1-Š31/1-Š31/2, E3/1-2-Š34/1-Š34/2
D7/1-Š57/2-Š57/1/1

VÝKOP RÝHY V PŘÍČNÝCH BOXECH, ČERPÁNÍ VODY Z

VÝKOPU 5x10H, POKLÁDKA DRENÁŽE, HUTNĚNÝ PODSYR

Š16, POKLÁDKA POTRUBÍ: A2-50m, C1/1-20m, E3/1-2-12m,

D7/1-12m, OBSYP POTRUBÍ OR, ZÁSTP RÝHY SE

ZHUTNĚNÍ PO VESTÁCH 1/2m.

TERÉNNÍ ÚPRAVY ŽOKA A, ÚKLID KOMUNIKACÍ +

ČISTÍCÍ VOZ, ZABEZPEČENÍ SKLÁDKY MATERIÁLU

ŽÁDÁNÍ DOD O PŘEVZETÍ KONSTRUKCE

POČASÍ: 2°C POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7-17h

22.3.21

PRACOVNÍCI: MTS-4, CINGEL-12

, SLOUHAL STAV-12

PO

STROJE: viz 19.3.21

PRÁCE: A2-Š2/6-Š2/7, C1/1-Š41/1-Š41/3, D7/1-Š57/2-Š57/1/1
E3/1-Š63/1-Š63/1/1

VÝKOP RÝHY V PŘÍČNÝCH BOXECH, ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU -

5x10H, POKLÁDKA DRENÁŽE, HUTNĚNÝ PODSYR Š16, POKLÁDKA


POTRUBÍ: A2-50m, C1/1-18m, D7/1-12m, E3/1-8m

ZASTAVENÍ SACHET Š2/7, 41/3, OBSYP POTRUBÍ OR

ZÁSTP RÝHY SE ZHUTNĚNÍ PO VESTÁCH 0,2m

ODVOZ ZEMINY NA OBZIDĚPOMI A NA SKLÁDKU, ÚKLID

KOMUNIKACÍ ČISTÍCÍ VOZEM, ZABEZPEČENÍ PRACOVISTE

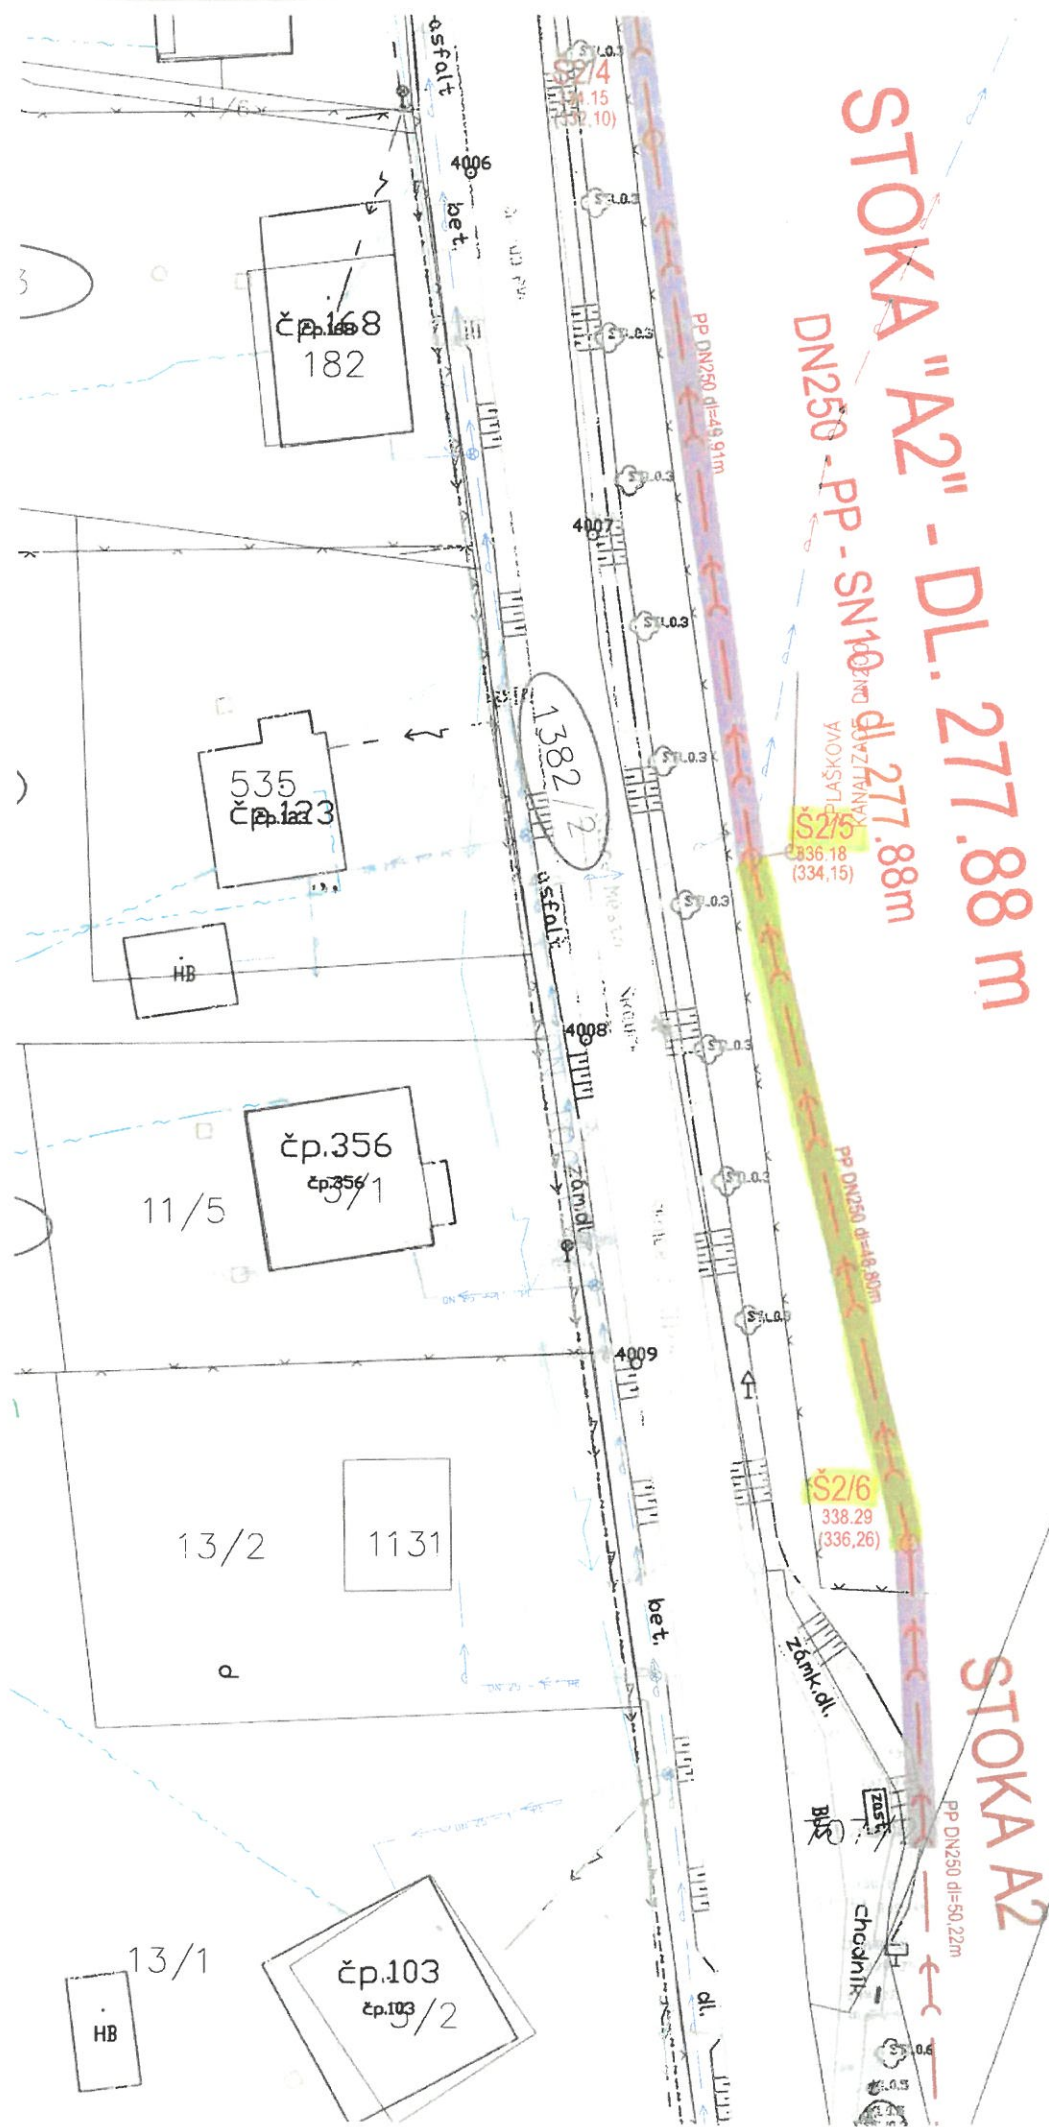

plánovaná zástavba R.I

lesní školka

705/1

plánovaná zást

STOKA A2

PP DN250 dl=50.22m

chodník

zámek

bet.

4009

4008

4007

4006

1382/2

S1/4
334.15
(332.10)

S2/5
336.18
(334.15)

S2/6
338.29
(336.26)

„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 –
kanalizace Skalice

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(dokončené stavby nebo její ucelené části)

Předávaná část:

část 1 Skalice

SO 01	Gravitační splašková kanalizace
SO 02	Kanalizační přípojky
SO 03	Čerpačí stanice ČS1-ČS5
SO 04	Tlaková kanalizace
SO 05	Přípojka NN elektro k ČS1-ČS5
SO 06	Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady
PS 01	Strojně technologická část ČS

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

ze dne 23.9.2022

Objednatel: statutární město Frýdek-Místek
Zástupce: [redacted]

TDI: ČECH-ENGINEERING, a.s.
Zástupce:

Zhotovitel: Metrostav a. s.
Zástupce: [redacted]

Ostatní účastníci řízení (organizace, pověřený zástupce):

Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava
Zástupce:

Název stavby:

„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalce, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalce

Místo: Skalce	Katastrální území: Skalce u Frýdku-Místku Dobrá u Frýdku-Místku	Číslo parcel: viz. geodetické zaměření
Číslo stavby: --	Zpracovatel DPS: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ 26475081	Zakázkové číslo PD:
	Zahájení prací: 8.6.2020	Dokončení prací: 23.9.2022

Smlouva o dílo:

- S/0665/2019/IO, číslo smlouvy zhotovitele: 19010625/Ve ze dne 25.10.2019
- Dodatek č.1 ze dne 23.9.2020
- Dodatek č.2 ze dne 18.11.2020
- Dodatek č.3 ze dne 18.3.2021
- Dodatek č.4 ze dne 30.4.2021
- Dodatek č.5 ze dne 28.7.2021
- Dodatek č.6 ze dne 21.10.2021
- Dodatek č.7 ze dne 9.12.2021
- Dodatek č.8 ze dne 9.2.2022
- Dodatek č.9 ze dne 28.3.2022
- Dodatek č.10 ze dne 3.5.2022
- Dodatek č.11 ze dne 30.5.2022
- Dodatek č.12 ze dne 12.7.2022
- Dodatek č.13 schválený na 114. schůzi Rady města Frýdku-Místku dne 20.9.2022

Rozsah díla:

část 1 Skalce

SO 01	Gravitační splašková kanalizace
SO 02	Kanalizační přípojky
SO 03	Čerpací stanice ČS1-ČS5
SO 04	Tlaková kanalizace

SO 05 Přípojka NN elektro k ČS1-ČS5
SO 06 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady
PS 01 Strojně technologická část ČS1-5

Cena díla:

Konečná cena díla je určena jako výsledek celkové nabídkové ceny díla dle SoD a ceny dle změnových listů ZL1 až ZL51 = 162 220 183,65 Kč bez DPH.

Provedené práce odpovídají schválené zadávací projektové dokumentaci a změnám stavby, projednanými a schválenými v rámci ZL. Změny jsou promítnuty do dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhodnocení kvality provedeného díla:

Dílo je provedeno v dobré kvalitě. Odpovídá smlouvě o dílo, schválené zadávací projektové dokumentaci, a změnám stavby, projednanými a schválenými v rámci ZL a technickým normám s výjimkou dále specifikovaných vad a nedodělků.

Soupis předávaných dokladů včetně soupisu provedených zkoušek a kontrol:
viz příloha č.1 - seznam předané dokumentace

Zjištěné vady a nedodělky nebrání užívání díla:

Viz. příloha č. 2a až 2f - soupis vad a nedodělků

Zjištěné vady a nedodělky dle přílohy 2a až 2f budou zhotovitelem odstraněny k datu 14.10.2022.

Záruční doba veškeré části plnění dle smlouvy o dílo:

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců.

Záruční lhůta začíná od 23.9.2022 a končí dnem 23.9.2027.

Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 36 měsíců ode dne předání díla.

Záruční lhůta plynout od 23.9.2022 a končí dnem 23.9.2025.

Zahájení přejímacího řízení dne: 23.9.2022

Přerušeno přejímacího řízení dne: ----

Ukončení přejímacího řízení dne: 23.9.2022

Vyklizení staveniště dle smlouvy o dílo: provedeno

Objednatel a TDI si vyhrazují právo na provedení podrobné kontroly úplnosti díla, všech náležitostí díla dle tohoto protokolu (včetně jeho příloh), včetně věcné správnosti dokladové části díla, a to do 14.10.2022.

Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele na konci záruční doby provést kamerovou kontrolu stokových úseků dle přílohy 3 - nejedná se o vady a nedodělky – vzešlo z požadavku budoucího provozovatele SMVaK

Objednatel si je vědom, že v kanalizaci je přítomna balastní voda, jež vniká do kanalizace přes pravděpodobně doložené domovní přípojky. Tato balastní voda není vada ani nedodělek. V případě, že bude v budoucnu prokázáno, že balastní voda vniká do kanalizace pochybením na straně zhotovitele, bude objednatel tuto vadu u zhotovitele reklamovat a zhotovitel ji odstraní v souladu s reklamačními podmínkami dle SoD.

Na základě průběhu řízení zástupce Zhotovitele předává a zástupce Objednatele, na základě doporučení TDI přebírá výše uvedené dílo ke dni 23.9.2022

Za objednatele:	Datum: 23.9.2022	Podpis:
Za TDI:	Datum: 23.9.2022	Podpis:
Za zhotovitele:	Datum: 23.9.2022	Podpis:
Další účastníci přejímacího řízení:		

2450/4
